BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

ALBUM TRIMESTRAL

Dirección de Inversión Pública

ENERO-MARZO 2017

Modernización del Blvr. Lázaro Cárdenas

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE - INFR
Modalidad	PR 2015 3RA.ASIGNACIÓN
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$73’658,500	$73’658,500	$73’599,000

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
99%	99%

Comentarios

Modernización del Blvr. Lázaro Cárdenas, delegación la Mesa (Construcción de puente vehicular).

Beneficiados

200,000 habitantes.

La construcción de este puente mejora la circulación vehicular de esta importante vialidad.

UABC campus Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	UABC TIJUANA
Modalidad	FAM SUPERIOR
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$29’862,820	$29’862,820	$18’617,299

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
59%	62%

Comentarios

Construcción de edificio administrativo para la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales: Oficinas administrativas, aulas de usos múltiples, cubículos para investigadores, aulas de posgrado.

Beneficiados

1,400 alumnos.

La construcción de éste edificio ayudará a mejorar y ampliar la cobertura educativa de esta institución.

UABC
Unidad Valle de las Palmas

Datos Generales	
Dependencia	UABC TIJUANA
Modalidad	FAFEF 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 4'999,996	$ 4´999,996	$ 3'279,297

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
87%	66%

Comentarios

Construcción de cafetería de la escuela de ciencias de la salud.

Beneficiados

2,342 Alumnos.

Al complementar la infraestructura de servicios de la universidad permite a esta mejorar el servicio a la comunidad.

Unidad Deportiva Romero Manzo

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 7'121,919	$ 7´121,918	$ 6'386,126

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
95%	89%

Comentarios

Rehabilitación de cancha de futbol soccer de la Unidad Deportiva Romero Manzo.

Beneficiados

3,000 habitantes.

Al proporcionar a la comunidad, espacios deportivos de primer nivel que incentiven las actividades deportivas y la convivencia familiar mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.

Cobach Nueva Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 8’265,271	$ 8’265,271	$ 4’959,163

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
65%	60%

Comentarios

Suministro e instalación de pasto sintético en cancha de futbol en Coach plantel Nueva Tijuana.

Beneficiados

Población en general.

Al ampliar la infraestructura vial de la ciudad, ofreciendo nuevas vialidades pavimentadas que mejoren la circulación vehicular y reduzcan la contaminación de la zona, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.

Estancia infantil Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN
Modalidad	AGI 2015
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 15’922,292	$ 14´252,534	$ 13’951,566

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
99%	97%

Comentarios

Construcción de estancia infantil en Tijuana, Baja California.

Beneficiados

6,900 habitantes.

Al brindar a las madres trabajadoras de esta localidad, instalaciones modernas, funcionales y seguras, para el resguardo y cuidado de sus hijos mientras cumplen su jornada laboral.

Corredor Cultural del Rio Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE TRT
Modalidad	FM TIJUANA 2016
Status de la obra	TERMINADA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 9’731,459	$ 9’731,459	$ 9’731,458

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de Acceso en corredor cultural del río Tijuana.

Beneficiados

25,000 personas.

Al complementar la infraestructura que une los museos Ámbar, Trompo y el Centro Estatal de las artes se impulsa la comunicación entre edificios fomentando la asistencia a esta zona cultural.

Cobach Nueva Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE BC
Modalidad	FAFEF-PESO A PESO
Status de la obra	TERMINADA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$5’276,040	$ 5´276,040	$ 5’276,040

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100%	100%

Comentarios

Construcción de edificio de talleres de danza, música-arte. (2 talleres, sanitarios y cafetería)

Beneficiados

2,824 Alumnos.

Al proporcionar nuevos espacios que amplían la capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio a la comunidad.

Cobach plantel Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE BC
Modalidad	FAFEF-PRO EXOE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 15’411,193	$ 11’428,209	$ 3’993,114

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
17%	35%

Comentarios

Const. edificio de 3 niveles (10 aulas, laboratorio de informática y ciencias, bodega de reactivos e instrumentos, centro de educación interactiva y cabina de mando).

Beneficiados

532 Alumnos.

Al proporcionar nuevos espacios que amplían la capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio a la comunidad.

Cobach Nueva Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE BC
Modalidad	FAM MEDIA SUPERIOR
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$7’422,404	$ 7’422,404	$ 5’195,683

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
76%	70%

Comentarios

Construcción de primera etapa de edificio módulo “B” 7 aulas, laboratorio múltiple, almacén, escaleras.)

Beneficiados

2,800 Alumnos.

Al proporcionar nuevos espacios que amplían la capacidad de servicio del plantel mejorando el servicio a la comunidad.

Cobach plantel Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE BC
Modalidad	FAM-REM. INFRAE. EDU.
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 6'000,000	$ 6´000,000	$ 3'432,664

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
54%	57%

Comentarios

Construcción de edificio de 4 aulas didácticas, 2 módulo sanitarios y escaleras.

Beneficiados

562 alumnos.

Al proporcionar nuevos espacios que amplían la capacidad del plantel mejorando el servicio a la comunidad.

CAR Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE EDIFICACIÓN
Modalidad	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$3’407,374	$3’407,374	$2’725,899

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
85%	80%

Comentarios

Remodelación de cancha de usos múltiples: recubrimiento de muros perimetrales, acabados y pintura en estructura.

Beneficiados

30,000 personas.

La rehabilitación de este espacio mejora las condiciones de las instalaciones y contribuye al desempeño de los deportistas.

Red de agua potable colonia Los Girasoles

Datos Generales	
Dependencia	CESPT EJECUCIÓN
Modalidad	APARURAL 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 10’964,808	$ 10’964,808	$ 7’318,530

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
99 %	67 %

Comentarios

Construcción de red de agua potable en la colonia los Girasoles, en el municipio de Tijuana.

(Tanque de 500 m³, línea de conducción e impulsión y tomas domiciliarias)

Beneficiados

5,000 personas.

Al ampliar la infraestructura hidráulica de la ciudad permitiendo al estado ampliar la capacidad de servicio, mejorando de esta forma la calidad de vida de la población.

Pavimentación de calles
Colonia Granjas Familiares el Tecolote

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’291,143	$ 1’291,143	$ 1’291,143

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Pavimentación de calles con 2,305 m^2 de losa y 650 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el señalamiento vial e instalación de tomas y descargas domiciliarias.

Beneficiados

3,000 Personas

Al pavimentarse 295 ml de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Pavimentación Calle Padre Hidalgo

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 4’763,963	$ 4’763,963	$ 3’464,374

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
75 %	73 %

Comentarios

Reconstrucción de vialidad de asfalto con 5,479 m² de losa y 1,326 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo tomas y descargas domiciliarias así como el señalamiento vial.

Beneficiados

3,000 Personas.

Al pavimentarse con concreto hidráulico la vialidad en una longitud 661 ml, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Pavimentación Lomas del Matamoros

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	CONT. ECON. 2015 1a ASIG.
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’304,881	$ 1’304,881	$ 1’304,881

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Pavimentación de calles con 2,555 m^2 de losa y 436 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el señalamiento vial e instalación 118 ml de línea sanitaria, tomas y descargas domiciliarias.

Beneficiados

5,000 Personas.

Al pavimentarse 240 ml de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Pavimentación Colonia Valle Verde

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	PDR 2016; FORT. FIN. 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 5’764,155	$ 5’764,155	$ 4’681,214

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
99 %	81 %

Comentarios

Pavimentación de calles con 4,854 m² de losa y 1,134 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el señalamiento vial, tomas y descargas domiciliarias.

Beneficiados

273 Personas.

Al pavimentarse 452 ml de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona

16/54822
16/55858

Pavimentación Ejido Chilpancingo

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’166,805	$ 1’166,805	$ 1’166,805

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Pavimentación de calles con 2,352 m^2 de losa y 423 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo el señalamiento vial.

Beneficiados

Personas.

Al pavimentarse 212 ml de calles con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Pavimentación Simón Bolívar

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’130,184	$ 1’130,184	$ 1’017,166

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
89 %	90 %

Comentarios

Pavimentación de calles con 1,882 m² de losa y 847 ml de guarniciones con concreto hidráulico incluyendo tomas y descargas domiciliarias asi como el señalamiento vial.

Beneficiados

250 Personas.

Al pavimentarse con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Nodo vial 20 de Noviembre

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE TIJ/RTO
Modalidad	PDR 2015 4a ASIGNACION
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 131’625,345	$ 131’625,345	$ 115’172,324

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
85 %	88 %

Comentarios

Construcción de nodo vial el incluirá pasos vehiculares a desnivel y reubicación de un tramo de la vía del ferrocarril asi como trabajos de: pavimentación, instalaciones hidro-sanitarias y pluviales.

Beneficiados

2,500 Personas.

Al modernizarse el importante crucero vial, con lo cual se solucionara definitivamente el congestionamiento vial que se da principalmente en horas pico.

Plaza 11 de Julio

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE EDIFICACION
Modalidad	PDR 2015 4a ASIGNACIÓN
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 49’105,679	$ 49’105,679	$ 8’840,893

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
63 %	18 %

Comentarios

Conclusión de multifloro: andadores, alumbrado, rampa de acceso y conexión a puente peatonal.

Edificio del ICBC: conclusión de pisos, habilitación de estacionamiento provisional.

Beneficiados

500,000 personas.

Esta construcción permitirá tener un espacio de convivencia y expresión en beneficio de la sociedad.

Instituto Tecnológico de Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	SEP INST TEC 2014
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 24’000,000	$ 24’000,000	$21’600,000

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
91 %	90 %

Comentarios

Construcción de primera etapa de la unidad académica departamental tipo IV: Un anexo, 23 aulas didácticas, 7 laboratorios y 2 módulos sanitarios.

Beneficiados

2,100 alumnos.

La construcción de este edificio mejorara las condiciones de las instalaciones y contribuirá al mejor desempeño de los docentes.

Instituto Tecnológico de Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	PRO EXOE 2015 SUPERIOR
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 23’550,000	$ 23’550,000	$ 9’211,743

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
40 %	39 %

Comentarios

Conclusión de la unidad académica departamental tipo IV: Un anexo, 23 aulas, 7 laboratorios y 2 módulos sanitarios.

Beneficiados

2,100 alumnos.

La construcción de este edificio mejorará las condiciones de las instalaciones y contribuirá al mejor desempeño de los docentes.

Corredor Lázaro Cárdenas (1ª Etapa)

Datos Generales	
Dependencia	DOIUM
Modalidad	F. METROPOLITANO 2015
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 19’860,120	$ 19’860,120	$ 13’202,075

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
68 %	66 %

Comentarios

Construcción de puente peatonal, incluyendo obra sanitaria y pluvial.

Beneficiados

25,000 Personas

Ya que con esta obra se hará el transito peatonal seguro y se evitarán accidentes en una de las zonas de mayor tráfico vehicular en la ciudad .

Pavimentación Colonia Olivos Norte

Datos Generales	
Dependencia	DOIUM
Modalidad	FORTALECE
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 4’895,550	$ 4’895,550	$ 4’609,550

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	94%

Comentarios

Pavimentación con concreto hidráulico las calles Alba Roja, Central, Mercurio y Portola.

Beneficiados

Personas

Al pavimentar las calles con concreto hidráulico se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones por un largo tiempo.

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	CONTING. ECON. 2015
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 2’464,276	$ 2’464,276	$ 1’478,566

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
66 %	60 %

Comentarios

Construcción de 4 aulas didácticas y escalera.

Beneficiados

180 Personas

Ya que con esta obra se ampliará la infraestructura educativa, en beneficio de la población estudiantil de nivel básico en la zona.

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	CONTING. ECON. 2015
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’436,873	$ 1’436,873	$ 1’436,873

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de arco/techo con estructura metálica.

Beneficiados

Personas

Ya que con esta obra se pueden hacer actos cívicos con comodidad al estar de la intemperie, en beneficio de todo el alumnado y personal docente.

Escuela Secundaria No. 214
Colonia Planicie

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	FAFEF 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 8’014,028	$ 2’404,208	$ 2’404,208

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
23 %	30 %

Comentarios

Construcción de albergue estudiantil y obras exteriores.

Beneficiados

289 alumnos

Ya que con esta se ampliará la infraestructura educativa del plantel y la estadía de alumnos foráneos o que vivan lejos de la escuela, en beneficio de todo el alumnado.

Primaria Centenario de la Revolución Fraccionamiento Rivera del Bosque

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	FAM BASICO 2016
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 2’650,366	$ 2’650,366	$ 2’650,366

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de 4 Aulas didácticas, bodega y escalera.

Beneficiados

140 Alumnos

Ya que con esta obra se amplio la infraestructura educativa, en beneficio de la población estudiantil de nivel básico en la zona.

Escuela Primaria Cocuchpaikilli Jardines de las Cruces

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	FAM BASICO 2016
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 2’173,972	$ 2’173,972	$ 2’173,972

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de 4 Aulas didácticas.

Beneficiados

140 Alumnos

Ya que con esta obra se amplio la infraestructura educativa, en beneficio de la población estudiantil de nivel básico en la zona.

Primaria Calmecac
Fraccionamiento Pórticos de San Antonio

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	FAM BASICO 2016
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 2’090,000	$ 2’090,000	$ 2’090,000

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de 4 Aulas didácticas y firme de concreto.

Beneficiados

140 Alumnos

Ya que con esta obra se amplio la infraestructura educativa, en beneficio de la población estudiantil de nivel básico en la zona.

Primaria Francisco Sarabia
Colonia Las Huertas 1a

Datos Generales	
Dependencia	INIFE
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	CONCLUIDA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 875,146	$ 875,146	$ 875,146

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	100 %

Comentarios

Construcción de gimnasio al aire libre.

Beneficiados

Alumnos

Ya que se contará con instalaciones donde los alumnos podrán practicar otro tipo de deporte, complementando las áreas deportivas ya existentes.

Centro de Desarrollo Comunitario

Datos Generales	
Dependencia	SEDESOE
Modalidad	PRONAPRED 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 1’020,000	$ 1’020,000	$ 938,400

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
95 %	92 %

Comentarios

Ampliación del centro comunitario en colonia el pípila.

Beneficiados

Personas

Ya que se ampliarán las instalaciones donde se reúnen los habitantes de la zona y tienen diversas actividades para la cohesión de la comunidad.

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada (tercera etapa)

Datos Generales	
Dependencia	CEA
Modalidad	CNA APAUR 2016 (proagua)
Status de la obra	PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$11’580,827	$11’580,827	$10’422,744

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
92%	90%

Comentarios

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada (tercera etapa) tramo del Blvr. Sánchez Taboada a calle segunda, Tijuana B.C.

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Con este tipo de obras se incrementa la infraestructura social básica que impactan en la calidad de vida de la comunidad.

55408

Mejoramiento de imagen urbana en la zona centro de la Ciudad

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE-TIJR
Modalidad	PRODERMAGICO
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 17’776,170	$ 17,729,999	$ 12’102,697

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
82%	68%

Comentarios

Mejoramiento de imagen urbana en la zona centro de la ciudad (Corredor Internacional).

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Con este tipo de obras se incrementa la infraestructura social básica que impactan en la calidad de vida de la comunidad.

16/54913

Col. Fovisste Quinta Alta

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 2’158,566	$ 2’158,566	$ 2’158,566

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100%	100%

Comentarios

Rehabilitación de carpeta asfáltica en diversas calles de la colonia Fovissste Quinta Alta

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Mayor desarrollo y modernización de infraestructura en el Estado.

16/55181

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada (cuarta etapa sección II)

Datos Generales	
Dependencia	CEA
Modalidad	CNA APAUR 2016 (proagua)
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 11’562,429	$ 11,562,429	$ 10’697,405

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
98 %	92 %

Comentarios

Rehabilitación de colector Sánchez Taboada (cuarta etapa sección II) del tramo PVCU-3 al PV-25 Tijuana B.C.

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Con este tipo de obras se incrementa la infraestructura social básica que impactan en la calidad de vida de la comunidad.

55409

Construcción de pozos de visita en Ave. Paseo de los Héroes

Datos Generales	
Dependencia	CEA
Modalidad	CNA APAUR 2016 (proagua)
Status de la obra	TERMINADA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 7’576,677	$ 7’576,677	$ 6’618,771

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100 %	87 %

Comentarios

Construcción de pozos de visita sobre colector líneas gemelas de techite en av. Paseo de los héroes Tijuana B.C.

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Con este tipo de obras se incrementa la infraestructura social básica que impactan en la calidad de vida de la comunidad.

55140

Centro de Justicia para la Mujer

Datos Generales	
Dependencia	SIDUE TRT
Modalidad	E-CONAVIM
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 9’999,999	$ 9’999,999	$ 4’995,826

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
49 %	50 %

Comentarios

Ampliación de instalaciones en el edificio del centro de justicia para la mujer.

Beneficiados

2,500 personas beneficiados

Este tipo de Proyectos ayudan a ejecutar obras de equipamiento Urbano para la procuración de justicia.

55696

Rehabilitación de Avenidas Chopo y Nogal

BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Datos Generales	
Dependencia	DOIUM
Modalidad	PDR 2016 2DA ASIGNACIÓN
Status de la obra	EN PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 19’427,076	$ 19’427,058	$ 5’828,117

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
38 %	30 %

Comentarios

Rehabilitación de avenida chopo y Nogal en Tijuana

Beneficiados

3,000 Personas

Al pavimentarse con concreto hidráulico, se mantendrá la superficie de rodamiento en óptimas condiciones durante largo tiempo, en beneficio principalmente de los habitantes de la zona.

Unidad deportiva Salvatierra

Datos Generales	
Dependencia	DOIUM
Modalidad	FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Status de la obra	PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$8’000,000	$8’000,000	$3’509,509

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
58%	44%

Comentarios

Rehabilitación de unidad deportiva: módulo sanitario, construcción de: Cancha de futbol rápido, rehabilitación cancha de usos múltiples, rehabilitación campo de beisbol, colocación de duela en gimnasio.

Beneficiados

1,000 Familias.

La rehabilitación de esta unidad deportiva mejora las condiciones de las instalaciones en beneficio de los usuarios.

55863

Unidad deportiva Tijuana

Datos Generales	
Dependencia	DOIUM
Modalidad	FID 2015
Status de la obra	TERMINADA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$ 15’666,418	$ 15’666,418	$ 15’666,418

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100%	100%

Comentarios

Construcción de equipamiento de centro de iniciación acuático en unidad deportiva Tijuana B.C.

Beneficiados

25,000 personas beneficiados

Mayor desarrollo y modernización de infraestructura deportiva en el Estado.

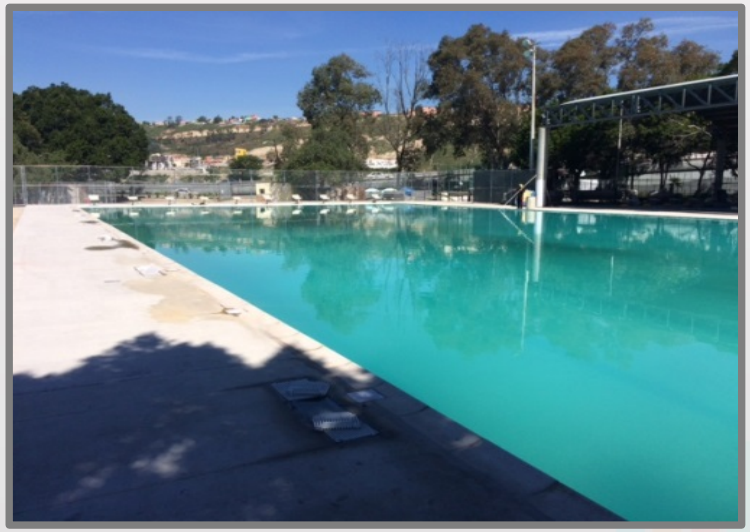

Colonia pedregal Santa Julia

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	TERMINADA

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$3'695,493	$3'695,493	$3'695,493

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
100%	100%

Comentarios

Pavimentación de diversas vialidades (calle Vicente Guerrero, Juan Álvarez y Géminis), con concreto hidráulico cubriendo una meta de 7,650m².

Beneficiados

500 Familias.

La pavimentación de estas vialidades mejora las condiciones de vida de sus habitantes.

55160

Colonia Francisco Villa

Datos Generales	
Dependencia	JUEBC
Modalidad	FORTALECE 2016
Status de la obra	PROCESO

Flujo de Inversión		
Aprobado	Contratado	Ejercido
$1’548,465	$1’548,465	$619,386

Avance de Inversión	
Físico	Financiero
42%	40%

Comentarios

5,000m² en rehabilitación con concreto asfáltico de vialidad Maclovio Herrera, incluye bacheo, re nivelación de pozos de visita y señalamiento vial.

Beneficiados

100 familias.

La realización de esta obra mejora las condiciones de vida de sus habitantes.

55168

55168
